


Harmonogram prací

Akce: REKO MS Chrastava - Revoluční + 1

ETAPA I.

3. 11. 2025 – Frézování vozovky v ulici Revoluční (od č.p.427 k č.p.487) + ulice Loudátova (u č.p.12). V pravém jízdním pruhu budou vyparkovány všechny automobily. Ulice Revoluční a ulice Loudátova budou po dobu činnosti frézy průjezdné, bude omezen provoz během frézování.

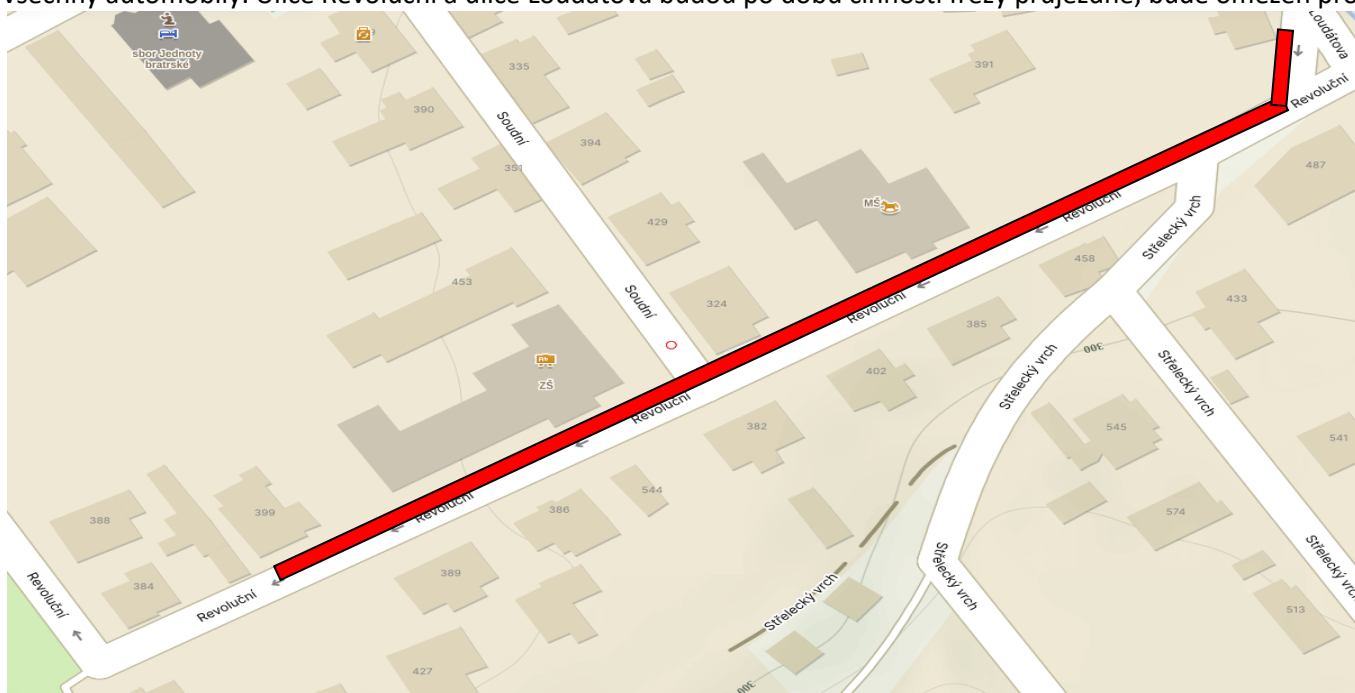

3. 11. 2025 – 14. 11. 2025 – Budou probíhat práce v ulici Revoluční (před ZŠ). Ulice Revoluční **nebude** během prací průjezdná. Objízdná trasa povede přes ulice Revoluční – Soudní – Bezručova – Revoluční. Pro rodiče s dětmi, kteří jedou do školy možnost parkování v ulicích Revoluční a Soudní.



ETAPA II.

17. 11. 2025 – 21. 11. 2025 – výkopové práce v **křižovatce Revoluční x Soudní**. Vozidla mohou přijet ke škole z ulice Revoluční, které bude v provozu v obou směrech či z ulice Soudní.



ETAPA III.

24. 11. 2025 – 5. 12. 2025 – budou probíhat práce v ulici Revoluční (před mateřskou školou). Ulice Revoluční **nebude** během prací **průjezdná**.
Objízdná trasa povede přes ulice Revoluční – Bezručova – Soudní - Revoluční.



ETAPA IV.

8. 12. 2025 – 19. 12. 2025 budou probíhat práce v ulici Soudní. Ul. Revoluční kompletně **zprovozněna**. Pozn.: Realizace Etapy IV. Bude záležet na klimatických podmínkách a dalších okolnostech. Případný další termín realizace - jaro 2026.

